


## 月間工事工程表

工事番号 A6-2-51025		2018 年 4 月																												現場代理人											
工事名 高浜小学校等整備事業		工期 2017/12/27 ~ 2021/3/30																												監理技術者	工事担当者										
		備 考																												伊藤	宇野	江戸									
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
工種	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火										
仮設工事			2-2・3工区 墨出し																4工区 墨出し																						
土工事			2-2・3工区 基礎足場組立て																	4工区 基礎足場組立て		Ⅲ-1工区 基礎足場解体 梁上仮設通路						Ⅲ-2工区 基礎足場解体 梁上仮設通路													
杭頭補強筋溶接工事			2-2・3工区 捨CON					残土搬出					4工区 基礎掘削・砕石敷き・捨型枠					4工区 捨CON					Ⅲ-1工区 埋戻し・砕石敷(外周先行)						Ⅲ-2工区 埋戻し・砕石敷(外周先行)												
鉄筋工事			Ⅲ工区 基礎配筋					Ⅱ工区 基礎配筋					Ⅲ-1工区 雨水貯留槽【FS1】配筋					Ⅲ-2工区 雨水貯留槽【FS1】配筋					Ⅲ-1工区 消火水槽配筋【FS2】																		
型枠工事			Ⅲ工区 基礎型枠					Ⅱ工区 基礎型枠					Ⅲ-1工区 基礎CON打設						Ⅲ-2工区 基礎CON打設						Ⅱ-1工区 基礎CON打設						Ⅱ-2工区 基礎CON打設										
コンクリート工事			Ⅲ工区 基礎CON打設					Ⅱ工区 基礎CON打設					Ⅲ-1工区 基礎CON打設 養生						Ⅲ-2工区 基礎CON打設 養生						Ⅱ-1工区 基礎CON打設 養生						Ⅱ-2工区 基礎CON打設										
学校行事			入学式(9:00~11:00騒音作業禁止)																学力テスト(終日騒音作業禁止)																						
記事	休日							休日								休日																			休日 祝日						



【掘削工事工区分け】

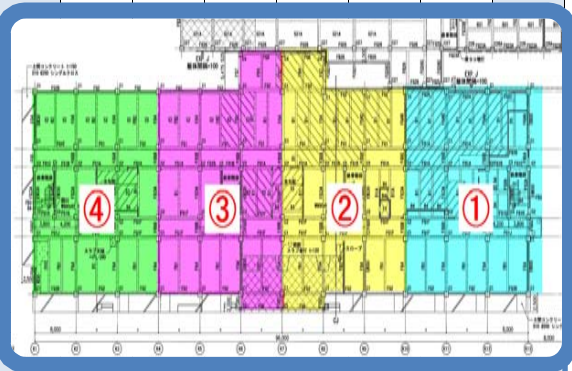

【基礎工事工区分け】
