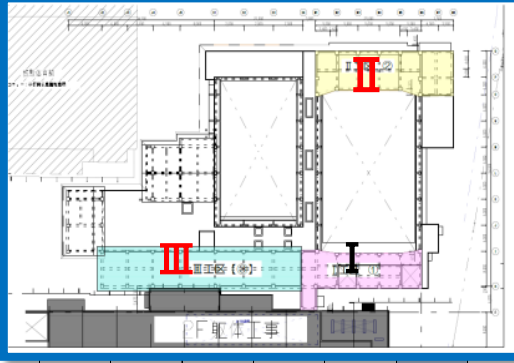
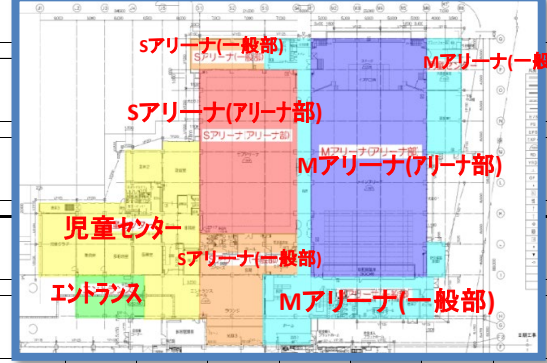


月間工事工程表

工事番号 A6-2-51025		2020年3月																													現場代理人 伊藤			監理技術者 宇野			主任技術者 中田		
工事名 高浜小学校等整備事業(Ⅱ期工事)		工期 2017/12/27 ~ 2021/3/30																													伊藤			宇野			中田		
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
工種	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火								
仮設工事	Sアリーナ・Mアリーナ 外部足場組立(2段目まで) ※上段は鉄骨建方後														Sアリーナ 外部足場組立																								
Mアリーナ(アリーナ部)																																							
仮設工事															鉄骨仮設納入																								
鉄骨工事															メインアリーナ 鉄骨建方・本締め・キャットウォーク荷揚げ・UBB搬入																								
Mアリーナ(一般部)																																							
左官工事															(Mアリーナ一般部)レベリング前段取レベリング打設 養生期間																								
	【2F躯体工事 工区分】														【内装工事 工区分】																								
サブアリーナ																																							
仮設工事	鉄骨仮設納入														本柱裏干渉材設置																								
型枠・Con工事															ALC受け立上型枠・小小屋立上Con 養生 脱枠・搬出																								
鉄筋工事															立上配筋・小小屋配筋																								
鉄骨工事	サブアリーナ 鉄骨建方・本締め キャットウォーク荷揚げ・UBB搬入														内装下地組・雑鉄骨組立																								
仮設鉄板部															※Sアリーナ内大型車両搬入可能期間(3/28まで) 土間鉄板撤去・砕石敷均し																								
Sアリーナ(一般部)																																							
左官工事															(Sアリーナ一般部)レベリング前段取レベリング打設 養生期間																								
I工区																																							
型枠工事 1F	1F・ビット梁、スラブ 支保工解体																																						
2F	【I工区】2F脱枠(柱・梁・壁側面)																																						
	支保工残置期間(3/24)																																						
2F															2F・ビット梁、スラブ 支保工解体																								
II工区																																							
仮設工事	BB梁枠・A.Bolt調整																																						
型枠・Con工事	段差型枠・返型																																						
1F	1F・ビット梁、スラブ 支保工解体																																						
2F	養生														【II工区】2F脱枠(柱・梁・壁側面)																								
	支保工残置期間(4/4)																																						
III工区																																							
	支保工残置期間(3/9)														【III-1工区】1F・ビット梁、スラブ 支保工解体																								
	支保工残置期間(3/17)														【III-3工区】1F・ビット梁、スラブ 支保工解体																								
	支保工残置期間(3/23)														【III-2工区】1F 梁、スラブ 支保工解体																								
III工区(2F躯体)																																							
仮設工事															屋根勾配アングル取付																								
型枠・Con工事	III工区 梁掛け・スラブ張り														Con打設前型枠確認 (B)ゲート使用																								
鉄筋工事	III工区 梁・スラブ配筋														養生 【III工区】2F脱枠(柱・梁・壁側面)																								
															支保工残置期間(4/14)																								
IV工区																																							
仮設工事																																							
型枠・Con工事	支保工残置期間(3/5)														【IV-1工区】1F 梁、スラブ 支保工解体																								
	支保工残置期間(3/23)														【IV-2工区】1F 梁、スラブ 支保工解体																								
グランド整備工事															グランド 仮囲い撤去・一部盛換え																								
学校行事															卒業式 ※騒音注意																								
幼稚園行事															卒園式 ※騒音注意																								
修了式															修了式																								
春休み															春休み																								
記事	休日							休日							休日						祝日		休日									【学校・幼稚園行事】 ・4/6(月)入学式 ※騒音注意 ・4/4(土)入園式AM ※騒音注意							
